



République Gabonaise
Union – Travail - Justice



RESEAU AGRISUD INTERNATIONAL



PROJET DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT AGRICOLE AU GABON PRODIAG

Convention de financement N° CGA 1145 01 A

**RAPPORT D'ACTIVITE N°1
4^{ème} TRIMESTRE 2011**



***Séminaire interne de préparation au démarrage du PRODIAG
Libreville, du 6 au 8 décembre 2012***



Préambule

Le présent document rend compte des d'activités menées au 4^{ème} trimestre 2011 par l'Institut Gabonais d'Appui au Développement (IGAD), dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement et d'Investissement Agricole au Gabon (PRODIAG). Il constitue ainsi le premier rapport d'activité de ce projet.

Le PRODIAG, dont la convention de financement a été signée le 24 février 2010 entre la République gabonaise et l'Agence française de développement (AFD), est prévu pour une durée de cinq (5) ans. Il est financé à hauteur de 13,2 milliards de Francs Cfa, dont 2,7 milliards sur fonds propres de l'Etat gabonais soit 20%, et 10,5 milliards, soit 80% sur un emprunt à l'AFD.

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural représentant l'Etat gabonais est le maître d'ouvrage et l'IGAD assure la maîtrise d'œuvre.

Suite à l'inscription des fonds du projet sur le budget de l'Etat, l'AFD a procédé à la mobilisation des ressources par le versement d'une caisse d'avance à l'IGAD. Ces fonds ont permis de poursuivre les activités de formation et de suivi-conseil aux exploitants agricoles par les équipes issues du projet PADAP, au sein d'un Dispositif National d'Appui mis en place avant le démarrage effectif du PRODIAG.

Entre temps, un séminaire interne de préparation au démarrage du PRODIAG a été organisé du 6 au 8 décembre 2011, réunissant tous les Agents de l'IGAD, y compris ceux de l'intérieur du pays. Les objectifs visés par ce séminaire sont les suivants :

- ✓ Informer l'ensemble des équipes sur les objectifs opérationnels du projet ;
- ✓ Partager, discuter et valider la méthodologie, les outils et les procédures de mise en œuvre du projet ;
- ✓ Valider in fine, les programmes de travail annuel et budgétaire élaborés pour le fonctionnement des composantes du projet, et partant, des différentes provinces du pays.

Une cérémonie de lancement officiel du projet est attendue dans les prochains jours.

Les principales activités conduites au sein des Composantes du 1^{er} octobre au 31 décembre 2011 sont présentées dans les pages suivantes.

1. PRESENTATION DE L'INSTITUT

Créé en juin 1992 à l'initiative de l'Etat Gabonais et de Total Gabon (ex Elf Gabon), l'Institut Gabonais d'Appui au Développement (IGAD) a pour objectifs principaux :

- ☞ le développement d'un tissu agricole périurbain de type privé, sous une forme d'agriculture sédentaire, intensive et protectrice de l'environnement ;
- ☞ l'approvisionnement des marchés urbains en produits frais locaux ;
- ☞ la valorisation des potentialités agricoles et para agricoles par la recherche développement.

L'Institut est constitué en une association à but non lucratif de droit gabonais, régie par la loi de décembre 1962. Il agit sous la tutelle technique du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural.

Il est régi par un Conseil d'Administration composé de quatre représentants de l'Etat Gabonais, deux représentants de Total Gabon et un représentant d'Agrisud International.


La méthodologie utilisée pour atteindre les objectifs fixés est présentée en trois étapes suivantes :

1. **Démonstration** : Création de projets incitatifs sous forme d'installation d'exploitations pilotes privées en situation réelle à la périphérie des centres urbains.
2. **Accompagnement et Capitalisation** : Capitalisation des éléments technico-économiques, sociaux et financiers issus des projets.
3. **Diffusion** : Formation et diffusion plus large : création de centres d'apprentissage pour la diffusion de la capitalisation et la formation d'agriculteurs ; mise en place d'outils d'appui (formation, appui au financement, encadrement...).

2. PRESENTATION DU PRODIAG

Le Projet de Développement et d'Investissement Agricole au Gabon (PRODIAG) a été élaboré, à la demande du Gouvernement gabonais, par l'Institut Gabonais d'Appui au Développement (IGAD). Initié en mai 2008, l'instruction du dossier PRODIAG a duré près de deux ans et demi avant de connaître la levée de la dernière condition suspensive. Le graphe ci-après présente les principales étapes de l'instruction du projet.

INSTRUCTION DU PRODIAG : RAPPEL DES ETAPES CLES

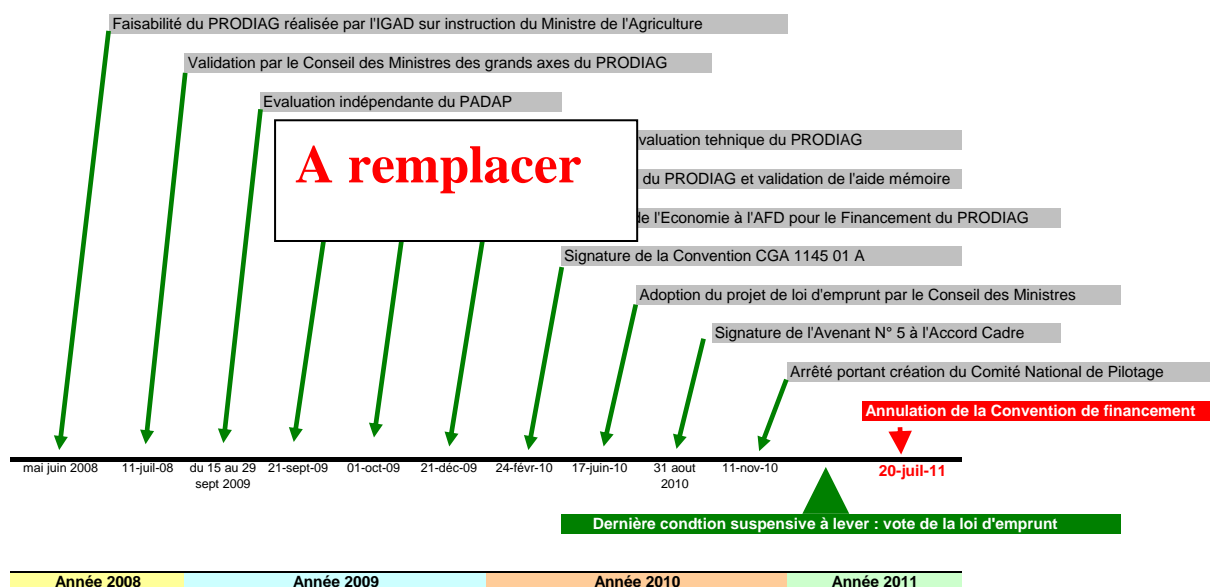

Le PRODIAG capitalise les visions, stratégies et outils stratégiques élaborés par le Gouvernement du Gabon et les conclusions de la mission d'évaluation de l'AFD d'octobre 2009 partagés par ses partenaires au développement, notamment l'Agence Française de Développement (AFD) :

Le PRODIAG prend en considération les faiblesses et atouts actuels du secteur agricole gabonais, il s'inscrit dans la continuité des activités réalisées par le projet PADAP et s'appuie sur ses acquis.

3. OBJECTIFS ET DISPOSITIF OPERATIONNEL DU PROJET

3.1. Les objectifs

Le PRODIAG a pour **objectif global** de contribuer significativement au renforcement de la sécurité alimentaire dans les principaux centres urbains par la promotion d'une agriculture entrepreneuriale performante et respectueuse de l'environnement.

Les deux **objectifs spécifiques** ci-après ont été assignés à ce projet. A savoir :

- ✓ Appuyer le développement de la production et de la commercialisation des produits agricoles ;
- ✓ Structurer la profession agricole afin qu'elle participe au développement de son secteur d'activité, qu'elle pèse économiquement dans les filières agricoles et qu'elle prenne part en toute connaissance de cause aux décisions la concernant.

3.2. Le dispositif opérationnel

Le dispositif opérationnel du PRODIAG comprend les cinq composantes suivantes :

Composante 1 : Appui Conseil aux Producteurs (ACP).

Cette composante a pour mission d'appuyer les exploitants agricoles à accroître sensiblement leurs marges nettes à la journée de travail et à l'unité de surface, et à maximaliser leurs revenus nets tout en veillant au respect de leur environnement.

Les activités qui seront conduites dans le cadre de cette composante sont :

- l'accompagnement des exploitants déjà installés par la diffusion du conseil de gestion à l'exploitation ;
- la création et la viabilisation de nouvelles zones de production accessibles aux nouveaux arrivants dans le secteur agricole ;
- la mise en place d'un dispositif de conseil en gestion des PME, ainsi que des groupements de producteurs ayant une activité économique soutenue.

Composante 2 : Formation Professionnelle agricole (FPA).

Elle est chargée d'apporter une formation professionnelle agricole aux personnes qui en expriment la demande.

Les activités envisagées sont les suivantes :

- poursuite des sessions de formation professionnelle initiales et continues d'adultes ;
- développement des sessions de formation sur la commercialisation ;
- développement des sessions de formation sur la gestion de groupements ;
- développement de formations sur la gestion durable des exploitations agricoles respectueuse de l'environnement ;
- production d'une note de réflexion sur la politique à mener en matière de formation professionnelle agricole et rurale ;
- participation aux travaux du Réseau FAR (Réseau International de formation agricole et rural).

Composante 3 : Recherche d'Accompagnement (RA).

Le projet poursuivra les travaux de recherche-développement sur les itinéraires techniques de cultures sur couverture végétale en vue de restaurer la fertilité des sols et de proposer des alternatives aux cultures itinérantes.

Les activités envisagées sont :

- poursuite des travaux de recherche sur les systèmes de cultures sur couvert végétal et sur la restauration de la fertilité des sols ;
- introduction de nouvelles cultures et variétés dans le dispositif de recherche et chez les exploitants ;

- établissement des partenariats avec les structures de recherches nationale et internationale.

Composante 4 : Appui à la Structuration Professionnelle Agricole (ASP).

Cette composante s'intéressera à la promotion des groupements de producteurs pour en faire des entités économiques viables susceptibles de fournir de véritables services à leurs membres, de promouvoir la représentation et la participation des producteurs au sein des instances qui traitent des affaires agricoles.

Il s'agira également de consolider les filières agricoles émergentes sensibles aux importations intempestives.

Activités en lien avec la structuration professionnelle du secteur :

- consolidation des organisations de producteurs agricoles dans leur mode de gouvernance et leur comptabilité-gestion afin qu'elles offrent de meilleurs services à leurs membres (accès aux intrants, distribution de l'eau, collecte et commercialisation des produits) ;
- promotion de nouveaux groupements d'intérêts économiques et d'organisations représentatives ;
- développement d'un dispositif de conseil en gestion des groupements de producteurs ;
- amélioration de l'écoulement et de la commercialisation des produits agricoles et consolidation des filières agricoles (notamment la filière de production d'œufs) ;
- poursuite de l'activité de l'observatoire économique sur les filières et du dispositif de Suivi Technico-Economique des exploitations agricoles (STE) ;
- poursuite de l'activité du Système d'Information sur les Marchés sur l'ensemble des provinces ;
- réalisation d'études diagnostics ;
- organisation périodique d'ateliers d'échanges par filière et de foires agricoles ;
- diffusion de l'information par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) ;

Composante 5 : Transformation Agro-Alimentaire (TAA)

Cette composante cherchera à promouvoir la transformation agro-alimentaire des produits agricoles, notamment celle du manioc, à destination du marché local.

Il s'agit pour cette composante d'assurer la formation des artisans, de leur apporter un appui technique et de gestion tout au long de leur installation et d'améliorer leur accès aux technologies post-récolte et de transformation.

Les activités consisteront en :

- la connaissance des processus de transformation locaux des produits agricoles, l'identification des spécificités et de la qualité des produits, des contraintes et des potentialités. L'identification des contraintes post-récoltes et des technologies appropriées ;
- la formation des producteurs à des pratiques plus efficaces et adaptés aux conditions du milieu ;

- le renforcement des capacités de gestion et techniques des petites entreprises de transformation artisanale ;
- la mise au point des processus de transformation, de conditionnement et de mise en marché ;
- la mise en place de contrôle interne de la qualité.

En complément des cinq composantes opérationnelles décrites ci-dessus, il est prévu de compléter le dispositif avec la mise en place d'un *fonds d'appui à l'installation et à l'équipement des exploitants agricoles et d'artisans agro-alimentaires*, et d'une *cellule de réflexion sur la sécurisation des investissements réalisés dans le secteur agricole*.

Le fonds d'appui à l'installation et à l'équipement des exploitants agricoles et para agricoles

En l'absence d'organisme dédié au financement du secteur agricole, le fonds va poursuivre les appuis que le PADAP apportait pour l'installation des exploitants agricoles et de les élargir aux artisans et/ou entrepreneurs de transformation agro-alimentaire.

Les conditions et le comité d'octroi définis dans le cadre du PADAP seront maintenus sur les deux années à venir.

La cellule de réflexion sur la sécurisation des investissements réalisés dans le secteur agricole

La Cellule de réflexion veillera à proposer les voies et moyens pour sécuriser l'activité et les investissements agricoles. Elle s'intéressera à ce titre au recensement et à la sécurisation foncière et mobilière des exploitations agricoles ainsi qu'à leur mode de financement.

Les activités prévues sont :

- le recensement des exploitations agricoles ;
- la création et l'animation de cadres de concertation des acteurs du secteur agricole et de la transformation agroalimentaire (administration, secteur privé, organisations de producteurs) aux deux niveaux national et provincial ;
- la production d'une note traitant du financement de l'agriculture ;
- le lancement de travaux sur la sécurisation des investissements réalisés avec l'appui du projet et sur la sécurisation foncière ;
- le développement d'un partenariat avec le Hub Rural de Dakar.

4. SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET

Les activités au quatrième trimestre 2011 ont porté essentiellement sur la préparation au démarrage du projet et sur la poursuite des opérations de terrain dans la limite des moyens disponibles.

Sur la base du cadre logique établis, il était question de rendre opérationnel le document projet en déclinant les objectifs en activités, puis en tâches, pour aboutir à l'élaboration du chronogramme de travail pour la durée du projet, soit cinq (5) ans et un chronogramme de travail pour l'année 2012. Les chronogrammes ont été élaborés pour chacune des composantes du projet, mais aussi pour les représentations provinciales de l'IGAD.

Les activités du trimestre écoulé ont ainsi concerné les aspects suivants :

- ⇒ la finalisation des affectations et l'installation des Représentants Provinciaux ;
- ⇒ l'actualisation des modules de formation ;
- ⇒ la poursuite des formations de candidats ;
- ⇒ le suivi - accompagnement des exploitants agricoles (maraîchers, vivriers et éleveurs) et para agricoles (transformateurs de manioc) en activité sur les périmètres aménagés par l'IGAD ;
- ⇒ la poursuite des opérations du Système d'Information sur les Marchés (SIM) et de Suivi Technico-Economique (STE) ;
- ⇒ la préparation des dossiers d'appels d'offres pour l'équipement du projet en différents biens ;
- ⇒ l'identification des sources d'approvisionnement en intrants et autres matériels agricoles nécessaires pour la mise en œuvre du projet ;
- ⇒ l'organisation d'un séminaire interne pour préparer le lancement du projet.

Ces différentes activités, menées au sein des composantes sont décrites ci-après.

4.1. Composante Appui Conseil aux Producteurs (CACP)

4.1.1. Les activités menées par la composante

Au cours du dernier trimestre 2011, la Composante ACP a poursuivi l'accompagnement des exploitants agricoles issus du projet PADAP, essentiellement les agriculteurs des périmètres aménagés par l'IGAD pour s'adapter aux moyens logistiques disponibles.

Parallèlement, d'autres actions ont été menées telles que :

- ⇒ l'accueil et l'entretien avec les personnes sollicitant des interventions diverses ;

⇒ les visites diagnostics d'exploitations en vue d'une prochaine prise en compte dans le programme d'activité en cours de démarrage ;

⇒ la réalisation d'un état des lieux des élevages installés à Libreville et à sa périphérie en vue de relancer le suivi conseil au sein de cette filière.

Sur le plan des réalisations physiques, une première mission relative à la création de quinze (15) exploitations maraîchères et d'un (1) élevage a été effectuée à Mouila. Le cahier des charges relatif aux travaux d'aménagement est en cours d'élaboration.

Le tableau ci-après présente les actions du trimestre à travers les différentes provinces.

	Estuaire	Haut Ogooué	Moyen Ogooué	Ngounié	Nyanga	Ogooué Ivindo	Ogooué Lolo	Ogooué Maritime	Woleu Ntém	Total
Demandes d'appui	4	12	13	4	10	1	4	1	8	57
Visites diagnostics	3	2	0	0	3	1	1	2	3	15
Suivi conseil	6	8	9	28	11	8	9	26	23	128

Ce sont 57 demandes d'appui qui ont été enregistrées dans l'ensemble des Représentations provinciales. Ces demandes portent sur l'aide en équipement et en intrants (petits matériels, fertilisants et pesticides...), ainsi qu'en conseils spécifiques.

Les visites diagnostic de terrain ont concerné 15 exploitations, lesquelles devront permettre d'évaluer les potentialités de développement des activités des candidats et aboutir à l'identification de petits projets, puis à l'établissement des conventions de collaboration.

Enfin 128 exploitants ont bénéficié du suivi conseil, en majorité les producteurs maraîchers (62%), suivis des producteurs vivriers (30%) et des transformateurs de manioc (5%) puis des éleveurs (3%).

4.1.2. Le séminaire interne

La composante a participé activement au séminaire interne de préparation au lancement du PRODIAG par la présentation des objectifs, outils et méthodologie d'intervention.

Le travail préalable a consisté à rassembler tous les supports techniques ayant servi à la gestion des précédents projets, de procéder à leur actualisation et adaptation puis à la création des nouveaux outils pour répondre au cadre du nouveau projet.

Ce travail s'est effectué à trois niveaux :

1.) Les aménagements d'exploitations.

- Choix des sites
- Définition des types d'aménagements par atelier
- Estimations des équipements spécifiques à commander
- Mise à jour de la base de données des prestataires pour les travaux spéciaux
- Actualisation des cahiers des charges des bâtiments d'élevages (porcs et poules pondeuses) des bâtiments d'exploitations pour les périmètres maraîchers et vivriers

2.) La sélection et la gestion des dossiers des candidats

- Définition des critères de sélection
- Définition du parcours des candidats
- Organisation de la gestion des dossiers des candidats

3.) Le suivi conseil technico-économique et l'intégration du concept de conseil en gestion

- Modélisation des systèmes de production par types atelier
- Estimations des besoins en matériel et intrants
- Constitution des kits à l'installation des candidats
- Supports de suivis (collectes, traitement et diffusion des données...)

Au terme du séminaire, l'équipe s'est attelée à élaborer le programme de travail de l'année 2012 pour la composante ACP, ainsi que celui de chaque représentation provinciale.

4.1.3. Les perspectives pour le trimestre suivant

Pour le prochain trimestre il est prévu :

- le lancement des travaux d'aménagement du périmètre agricole de Mouila ;
- l'élaboration du cahier des charges pour la création d'un périmètre de 25 exploitations maraîchères et de 3 élevages à Port-Gentil ;
- le démarrage d'un programme de suivi des élevages après présentation des résultats de l'état des lieux ;
- la prospection de sites pour l'aménagement de parcelles agricoles dans les provinces ;
- la commande des équipements et matériels pour l'installation des bénéficiaires sur les nouvelles exploitations.

4.2. Composante Transformation Agro Alimentaire

Au cours du trimestre, la composante a axé ses activités sur le suivi des ateliers de transformation du manioc installés par l'IGAD, la gestion des moyens logistiques et la préparation et l'organisation du séminaire interne de lancement du PRODIAG.

4.2.1. Le suivi des ateliers de transformation de manioc

Il s'est agi des **8 ateliers** installés dans les provinces du Woleu Ntem, de l'Ogooué Ivindo, de l'Ogooué Lolo, et de la Nyanga suivis par les Représentants Provinciaux et dont les résultats sont remontés au Chef de composante, et de l'unique atelier de la province de l'Estuaire suivi directement par le Chef de Composante.

Pour des raisons d'éloignement, les 2 ateliers de la province de la Ngounié n'ont pas bénéficié d'un suivi régulier, hormis pendant les missions. Quoiqu'il en soit, ils fonctionnent en toute autonomie depuis leur installation.

4.2.2. Le séminaire interne de l'IGAD

Pour préparer le séminaire interne de l'IGAD la Composante a préalablement travaillé sur les éléments suivants :

- ✓ l'élaboration de la fiche Procédure-Outils-Méthodologie d'intervention (fiche POM) par la création et l'adaptation des outils tels que les critères de sélection des candidats, la fiche d'identification, les critères de choix d'un terrain, la fiche de suivi-conseil, l'avis du comité d'octroi ;

- ✓ l'élaboration des chronogrammes de travail annuel pour la Composante et pour les différentes provinces.

Pendant le séminaire interne, la Composante Transformation Agro Alimentaire a présenté ses objectifs quantitatifs et qualitatifs dont les principaux sont les suivants :

- ✓ la mise au point des procédés de transformation ;
- ✓ la diffusion des technologies alimentaires mises au point et pratiquées ;
- ✓ le conseil en gestion de l'activité et la culture d'entreprise ;
- ✓ l'installation de 40 unités de transformation de produits agricoles ;
- ✓ l'identification des contraintes post-récolte et des technologies appropriées ;
- ✓ la mise en place d'un système de contrôle interne de la qualité...

4.2.3. La gestion de la logistique de l'IGAD

La logistique fait partie des activités confiées à la Composante TAA et menée en soutien aux équipes de l'Institut. Il s'agit des équipements, de la maintenance, mais aussi des approvisionnements et expéditions pour le fonctionnement des équipes.

Les différentes interventions ont porté sur les véhicules, les bâtiments, les équipements informatiques et de bureau.

Tous ces outils de travail qui sont vieillissants nécessitent d'importants frais d'entretien et une diligente utilisation.

Pour le démarrage du PRODIAG, un état des besoins en matériels et équipements de l'Institut a été effectué. Suite à cet inventaire, des dossiers d'appel d'offres ont été élaborés et soumis à l'Agence Française de Développement (AFD) pour avis de non objection (ANO) avant leur lancement. Il s'agit des dossiers de véhicules et de matériel informatique, d'acquisition de pesons, GPS, balances numériques et mobilier de bureau pour les représentations provinciales.

4.2.4. Les autres activités de la composante

Suite à la décision n°0020 MAEPDR/CAB du Ministre de l'Agriculture, portant création du Comité d'organisation de la Journée Nationale de l'Agriculture édition 2011, l'Institut a été associé à l'organisation de cette manifestation.

Deux représentants de l'IGAD ont été désignés, dont le Chef de la Composante TAA. Ainsi, il était question de participer tout d'abord à la journée mondiale de l'alimentation qui avait pour thème « prix des denrées alimentaires : de la crise à la stabilité » le 9 octobre 2011, ensuite à la Journée Nationale de l'Agriculteur (JNA), qui a connu l'organisation d'une foire agricole.

L'évènement a vu la participation de toutes les institutions, entreprises, magasins et promoteurs du monde agricole évoluant au Gabon du 24 au 26 novembre 2011.

4.2.5. Les perspectives pour le trimestre suivant

Au terme de cette présentation, des débats, et remarques pertinents ont suivi, principalement sur le choix des produits à transformer, le choix du lieu d'implantation des ateliers, les critères de choix des acteurs, pour ne citer que cela.

Les recommandations formulées ont dicté l'essentiel du travail à réaliser pour le trimestre suivant. A savoir :

- finaliser le travail déjà entamé (outils, méthodologie, chronogramme,...) ;
- harmoniser les outils par rapport à ceux des autres composantes ;
- préparer des modèles de conventions d'installation pour les ateliers de transformation de manioc ;

- adapter les différents cahiers des charges pour la construction des bâtiments, la fabrication des râpes motorisées, des foyers améliorés et des autres matériels et équipements ;
- poursuivre le traitement des dossiers d'appels d'offres pour le projet ;
- lancer les activités de création d'ateliers de transformation dans les provinces du Moyen Ogooué et de la Nyanga ;
- poursuivre le suivi conseil dans les unités de transformation existantes.

Tous ces dossiers seront validés par l'Unité de Gestion du Projet avant leur diffusion.

4.3. Composante Appui à la Structuration Professionnelle

Les activités menées au cours du 4^{ème} trimestre par l'équipe de la Composante ASP se présentent ainsi qu'il suit :

4.3.1. Le Système d'Information sur les Marchés (SIM)

Le dispositif du SIM est toujours fonctionnel dans la province de l'Estuaire. Au cours du trimestre 135 bulletins de prix étaient édités et diffusés comme à l'accoutumé.

4.3.2. Le Suivi Technico-Economique (STE)

Le STE est fonctionnel dans l'Estuaire. Seulement, la collecte de données est momentanément arrêtée pour des raisons de réorganisation des effectifs de l'institut. Elle se poursuivra dès le recrutement et la mise à disposition d'un technicien.

Aussi, un traitement des différentes bases de données tenues a été réalisé. La situation des indicateurs technico-économiques qui en résulte tient lieu de situation de référence du PRODIAG. Les différents éléments y relatifs pourront être d'usage pour le lancement des activités de Suivi-Evaluation du projet.

4.3.3. Le Centre de Documentation Interne (CDI)

Un total de 24 visiteurs dont principalement les étudiants ont fréquenté le CDI au cours du trimestre. Ce chiffre est en forte baisse par rapport aux trimestres précédents où nous enregistrons une moyenne de 50 visiteurs. Avec le démarrage du PRODIAG et les opérations de communication qui vont accompagner cette intensification des activités de l'IGAD, nous pensons qu'au cours des prochains trimestres, ce chiffre sera en augmentation.

4.3.4. La préparation au démarrage du PRODIAG

L'essentiel des activités du dernier trimestre de l'année 2011 était en grande partie consacré à la préparation du démarrage du PRODIAG. Cette préparation s'est déroulée en trois (3) étapes suivantes :

- ✓ la reprise du document projet pour une déclinaison des objectifs de la composante en activités, sous activités et tâches ;
- ✓ le montage des chronogrammes (chronogramme sur les 5 ans du projet et chronogramme de l'année 2012) ;
- ✓ la préparation du séminaire interne qui s'est tenu du 06 au 08 décembre 2011.

En corollaire à ce travail, une réflexion a été amorcée par la Composante sur les dispositifs opérationnels et la méthodologie de certains volets d'activité. Il s'agit notamment :

- ✓ du montage du dispositif des « enquêtes tonnages », qui n'existait pas dans le PADAP, pour le Système d'Information sur les Marché,
- ✓ du dispositif de suivi des indicateurs dans le vivrier et l'élevage pour ce qui concerne le Suivi Técnico-Economique (STE), sachant que pendant le PADAP ce volet s'était essentiellement déployé sur l'activité maraîchère.

Le montage de ces éléments de méthodologie (avec les outils et base de données que cela implique va se poursuivre et se finaliser au cours du prochain trimestre.

Les études (études de filières et études de systèmes d'exploitation agricoles) ainsi

Etudes diagnostiques
Diagnostics des nouvelles zones d'intervention/actualisation
Diagnostic socio agro-économique de Lastourville et Pana
Diagnostic socio agro-économique de Bitam et Mitzic
Diagnostic socio agro-économique de Mékambo et Boué
Diagnostic socio agro-économique de Lébamba et Ndendé
Diagnostic socio agro-économique de Moabi et Moulengui Bindza
Diagnostic agro socio -économique de Moanda et Franceville
Diagnostic agro socio -économique d'Okondja
Diagnostic agro socio -économique d'Oyem
Etudes des systèmes d'exploitation agricoles
Systèmes d'exploitation agricoles sur l'axe Makokou-Mékambo
Systèmes maraîchers de plein champ dans l'Estuaire
Systèmes maraîchers sur billons dans l'Estuaire
Systèmes d'exploitation garicole zone de Lébamba (Ngounié)
Systèmes maraîchers dans la zone frontalière Gab-Guiné Eq-Cam
Systèmes d'élevage des petits ruminants au nord du Gabon
Systèmes agricoles de banane plantain zone de Dilemba (Nyanga)
Système agricoles de taro et banane sur l'axe Koulamoutou-Iboundji
Etudes de filières
Filière des céréales importées (riz et blé)
Filières d'importation et de production locale de fruits
Filières d'importation et de production locale des oléagineux
Filières d'importation et de production locale de maïs
Filières d'importation des tubercules (taro, patate douce, igname)
Filières d'importation et de distribution de l'oignon bulbe
Actualisation filière œuf
Actualisation filière banane plantain
Actualisation filières viandes
Actualisation filière manioc

que les diagnostics agro-socio économiques des nouvelles zones d'intervention représentent un volet important dans les activités de la Composante. Les travaux à réaliser qui étaient jugés pertinents pour le projet sont consignés dans le tableau ci-contre.

Les diagnostics des nouvelles zones d'intervention visent l'objectif d'éclairer le projet sur le contexte de chacune de ces localités, en rapport avec les prévisions du PRODIAG. Ces études sont prévues de manière prioritaire en 2012, pour permettre un démarrage rapide des opérations dans ces nouvelles zones d'intervention.

4.4. Composante Formation Professionnelle Agricole (CFPA)

Au 4^{ème} trimestre 2011, la Composante FPA a poursuivi les activités de formation, et de conception des modules de formation, parallèlement avec la préparation au lancement du PRODIAG. Les principales actions conduites sont décrites ci-après.

4.4.1. Les formations dispensées

Durant ce trimestre, les formations ont été dispensées à l'Estuaire, uniquement dans le domaine du maraîchage.

Deux sessions en initiation et une session en spécialisation ont été organisées au bénéfice de **31 stagiaires**.

En initiation, ce sont vingt quatre (24) stagiaires qui ont suivi la formation, tandis qu'en spécialisation on en compte sept (7).

Les formations au vivrier n'ont pu avoir lieu en de raison des problèmes logistiques. Aussi, l'Institut privilégie désormais la formation des candidats disposés à l'installation sur des périmètres vivriers aménagés qui représenteront 80% du public cible du PRODIAG. Les candidats indépendants, à la proportion de 20% devront avant toute formation présenter un projet. Cela limitera le nombre de personnes qui ne démarrent pas une activité au terme de la formation.

4.4.2. L'actualisation et la validation des modules de formation

En vue de répondre aux orientations de l'évaluation du projet PADAP, qui recommandait de porter un accent particulier sur la gestion économique des exploitations agricoles, une révision du module gestion est préconisée et porte sur la comptabilité et la gestion d'une exploitation agricole, ainsi que l'établissement d'un plan de développement d'une petite et moyenne entreprise agricole.

Le but étant d'apporter une formation complémentaire en comptabilité gestion d'entreprise, de sorte à mettre en place un suivi conseil complet axé sur les plans technique, économique et financier.

Ce travail d'actualisation et d'adaptation des modules aux nouvelles données se poursuit et pourra être achevé au courant du deuxième trimestre 2012.

4.4.3. L'inventaire des besoins de la Composante

Cet inventaire a permis d'établir des besoins en matériels pédagogique et didactique de la Composante. Suite à cette opération, un mode de gestion des stocks des magasins relevant de notre responsabilité a été mis en place. Un cahier de gestion des stocks est exploité pour un meilleur suivi du matériel et des intrants.

4.4.4. La centralisation des demandes de formation

L'analyse des fiches d'entretien enregistrées depuis le début de l'année 2011 nous aura permis classer les différentes demandes de formation. Ce travail est également poursuivi à l'intérieur du pays par des Représentants Provinciaux de manière à programmer à l'avance les sessions de formations tout au long de l'année 2012.

4.4.5. Le séminaire interne de l'IGAD

La Composante formation professionnelle agricole à l'instar des autres Composantes a produit une fiche Procédure-Outils-Méthodologie (fiche POM) comprenant la méthodologie de sélection des candidats, les critères de sélection de ces candidats, les fiches d'entretien et d'identification.

Parallèlement à cela, un programme de travail de la Composante et des provinces pour l'année 2012 et un autre pour les 5 années du projet ont été élaborés. Ces chronogrammes font ressortir les différentes activités, opérations et tâches qui seront réalisées à des périodes bien précises, conformément aux objectifs du PRODIAG.

4.5. Composante Recherche d'Accompagnement

4.5.1. Les activités de recherche

Expérimentations en milieu contrôlé :

Site de NTOUM

Au cours du dernier trimestre 2011, les activités au centre de Ntoun ont porté sur l'introduction de deux nouvelles cultures. Il s'agit du soja et du riz cultivés sur couverture végétale.

Cependant, la mauvaise qualité des semences de soja (3 % de levée) n'a pas permis la conduite à terme de l'essai.

Pour ce qui concerne le riz, deux cultivars de variété Nerica non caractérisés ont été semés. Le premier a été cultivé sur couverture morte de *Mucuna* et le second sur témoin (sol nu) et sur couverture morte de *Pueraria*. Malgré l'insuffisance des semences, les deux cultivars ont présenté un bon taux de germination (85 % de levée en moyenne).




Des deux cultivars, celui mis en place sur *Mucuna* semble s'adapter au contexte agroécologique du site de Ntoun. Le remplissage des graines s'est fait normalement sur toutes les panicules (voir photo ci-dessus).



Sur l'autre cultivar, la fécondation est anormale, toutes les graines sont vides malgré le bon développement végétatif.

Par rapport à la pluviométrie, la figure ci-dessous montre que, le cumul de la pluviométrie du premier semestre est plus faible que celui du second semestre entre 2003 et 2011 sauf en 2009 et 2010.

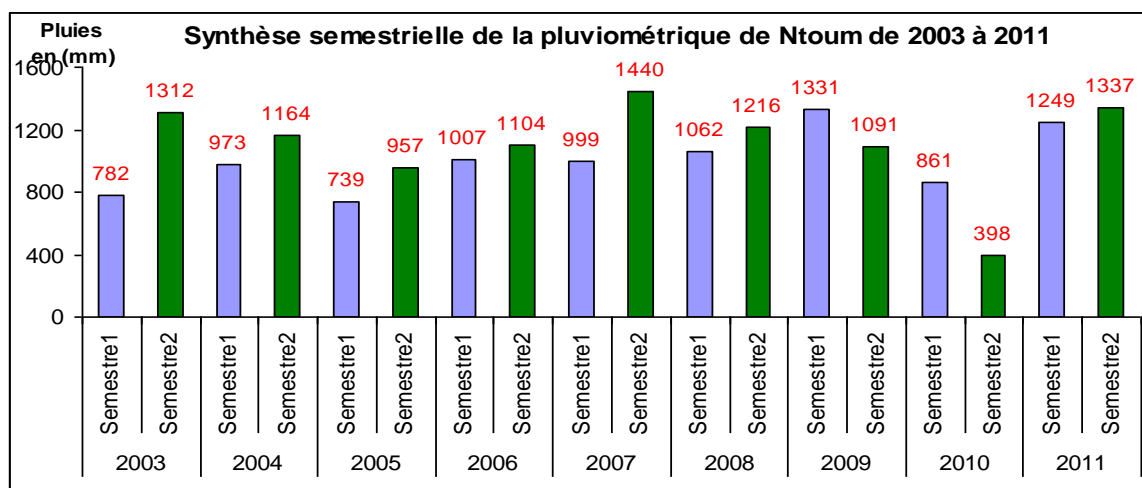

En 2011, le cumul du premier semestre (1249 mm) est plus faible que celui du second semestre (1337 mm) soit une moyenne mensuelle de 206 mm d'eau au second semestre. Cette moyenne est suffisante pour la conduite d'une riziculture pluviale qui nécessite entre 150 et 200 mm d'eau par mois.

Site de NKAN :

Le suivi de l'essai pluriannuel sur la comparaison des systèmes de culture de bananiers sur sol nu avec les systèmes sur *Bracharia ruziziensis* et sur *Stylosanthes guyanensis* en bandes alternées mis en place en octobre 2005 continue.

Au cours de ce trimestre, nous avons procédé à nouveau au basculement (switch) des bandes cultivées pour une quatrième fois.

Nous sommes ainsi à notre 7^{ème} cycle de culture de bananier sur une même parcelle.

Le tableau ci-après présente l'évolution des différents rendements depuis le début de l'essai.

Durée	Système Bracharia		Système Stylosanthes		Système Témoin	
	Poids moyen du régime (kg)	Rendement (T/ha)	Poids moyen du régime (kg)	Rendement (T/ha)	Poids moyen du régime (kg)	Rendement (T/ha)
Année 1	15	18,5	16	20,4	13	22,0
Année 2	13	15,9	13,3	16,6	8	13,3
Année 3	15	18,8	14	17,5	13	21,7
Année 4	14	17,5	11	13,8	8	13,3
Année 5	9	10,9	9	10,9	6	10,7
Année 6	8	10,5	7	8,4	6	9,3
Moyenne	12	15,3	11,7	14,6	9,0	15,0

Après six années de culture de bananier, nous observons la chute des rendements quel que soit le système. Les chutes de rendement de 43% sur *Bracharia*, 58% sur témoin et 59% sur *Stylosanthes* sont enregistrées. Le système avec *Stylosanthes* a déjà perdu toute sa couverture ce qui pourrait expliquer le rapprochement du niveau de chute des rendements avec le témoin.


Il faut toutefois noter que la baisse de rendement observée particulièrement entre 2010 et 2011 peut s'expliquer par deux principales raisons :

- les saisons sèches très longues et bien marquées ;
- les casses et chutes des bananiers consécutives aux intempéries, enregistrées en septembre dernier (près de 30% en fructification sur *Bracharia*, 10 % sur Témoin et 12 % sur *Stylosanthes*).

La baisse de rendement sur *Bracharia* est plus liée au fort pourcentage des chutes enregistrées sur ce système.

Le poids moyen du régime est plus important sur *Bracharia* que sur témoin après 6 ans de culture.

S'agissant de la pluviométrie de Nkan, on observe une baisse des précipitations sur l'ensemble des trois dernières années (voir graphique ci-après).

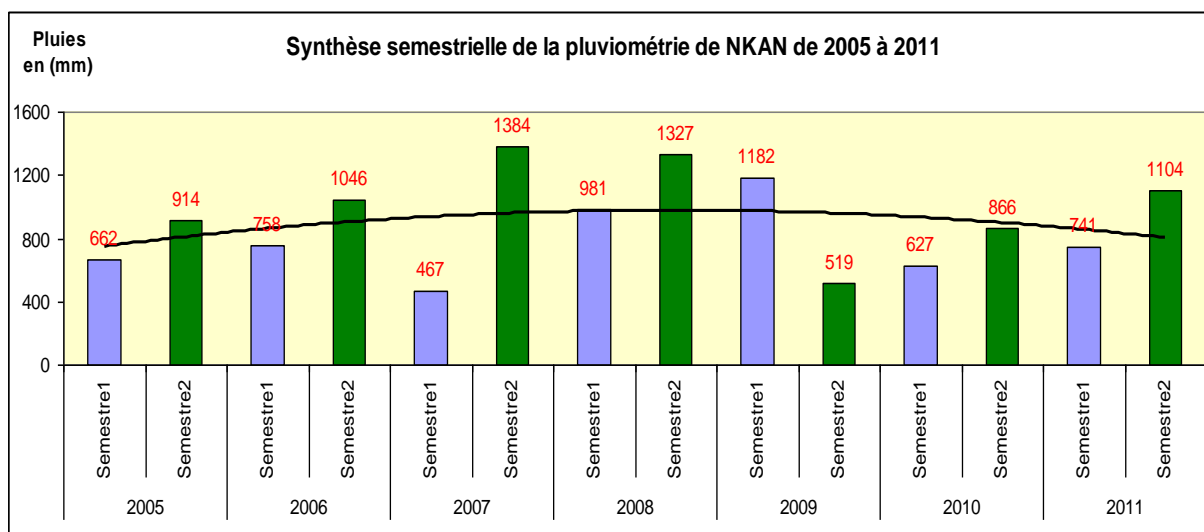

4.5.2. Les autres activités :

Collaboration avec Maurel et Prom

En début du mois de novembre, la Composante a effectué une mission dans la zone de Coucal, dans la province de la Ngounié. Cette mission avait pour objet de restituer les résultats de l'étude effectuée en juillet 2011 dans le cadre de la collaboration avec la société pétrolière Maurel et Prom.

4.5.3. Le séminaire interne de l'IGAD

Durant ce trimestre la Composante a travaillé sur la préparation du séminaire interne en élaborant les modèles de systèmes de culture qui seront vulgarisés dans les périmètres vivriers du PRODIAG (Voir rapport du séminaire).

La méthodologie de sélection des candidats pour l'installation des unités de multiplication des Plants de bananier Issus des Fragments de tige (PIF) dans les neuf provinces du Gabon a été également élaborée.

Vers la fin du trimestre, la Composante a réalisé des prospections dans la province de l'Estuaire pour l'acquisition d'un terrain d'une trentaine d'hectares. Le site de l'ex bananeraie du CIAM (SONADEC) situé à une dizaine de kilomètres de Ntoun a été retenu et son plan de masse a été réalisé.

Ce site aura pour rôle d'abriter les différents essais de mécanisation agricole sur la base des systèmes de culture sur Couverture Végétale (SCV).

5. RESSOURCES HUMAINES

5.1. Suivi des effectifs du projet

Les ressources humaines affectées au projet sont présentées dans le tableau ci-après :

- Effectif présent au 1^{er} octobre 2011 : XX
- Mouvements : Entrée XX
 Sortie XX
- Entrées :
- Effectif au 31 décembre 2011: XX

Au 31/12/2011 l'effectif total du PRODIAG s'élève à XX personnes.

Une prochaine vague de recrutement est prévue pour renforcer.

5.2. Les missions d'appui

6. GESTION BUDGETAIRE

7. PROGRAMMATION 2012

7.1. Programmation technique

Les objectifs du projet pour 2012 sont présentés sous forme de chronogramme pour chaque composante.

Un commentaire synthétique résume les principales réalisations.

La Composante Appui Conseil aux Producteurs

Composante Appui Conseil aux Producteurs		Chronogramme 2012											
Activités / Opérations / Tâches	RH	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Dec
Elaboration des Procédures, Outils et Méthodologie de travail													
Fiches Procédures Outils et Méthodologie (POM)													
Mise à jour des critères de choix des sites	CC												
Actualisation des critères de sélection des bénéficiaires	CC												
Méthodologie de suivi des bénéficiaires	CC												
Création et viabilisation des nouvelles zones de production													
Prospection des sites à aménager :													
Diagnostic agro-socio économique (Composante ASP) ;													
Prise de contact avec les autorités locales ;	UGP RP												
Identification des terrains ;	RP												
Démarches d'acquisition foncière.	UGP												
Aménagement de 45 exploitations Maraichères :													
Elaboration des cahiers des charges ;	CC, AT												
Préparation des dossiers des appels d'offres ;	CC, AT												
Lancement des appels d'offres ;	CC												
Commande des équipements, intrants et matériels agricoles ;	CC												
Evaluation des offres sélection des entreprises et démarrage ;	CC												
Préparation et lancement des travaux d'aménagement des sites ;	CC												
Suivi de l'exécution des travaux ;	RP												
Réception des travaux (provisoires et définitives).	RP												
Rehabilitation des anciens périmètres maraichers :													
Elaboration des cahiers des charges ;	CC, AT												
Préparation des dossiers des appels d'offres ;	CC												
Lancement des appels d'offres ;	CC												
Commande des équipements et matériels ;	CC												
Evaluation des offres sélection des entreprises et démarrage ;	CC												
Préparation et lancement des travaux d'aménagement des sites ;	CC												
Suivi de l'exécution des travaux ;	RP												
Réception des travaux.	RP												
Aménagement de 190 exploitations vivrières :													
Elaboration des cahiers des charges ;	CC, AT												
Préparation des dossiers des appels d'offres ;	CC, AT												
Lancement des appels d'offres ;	CC												
Commande des équipements, intrants et matériels agricoles ;	CC												
Evaluation des offres sélection des entreprises et démarrage ;	CC												
Préparation et lancement des travaux d'aménagement des sites ;	CC												
Suivi de l'exécution des travaux ;	RP												
Réception des travaux (provisoires et définitives).	RP												
Aménagement de 10 exploitations d'élevage :													
Elaboration des cahiers des charges ;	CC, AT												
Préparation des dossiers des appels d'offres ;	CC, AT												
Lancement des appels d'offres ;	CC												
Commande des équipements, intrants et matériels agricoles ;	CC												
Evaluation des offres sélection des entreprises et démarrage ;	CC												
Préparation et lancement des travaux d'aménagement des sites ;	CC												
Suivi de l'exécution des travaux ;	RP												
Réception des travaux (provisoires et définitives).	RP												
Installation et suivi / accompagnement des producteurs													
Installation de 45 bénéficiaires sur les périmètres maraichers aménagés :													
Campagnes d'information et de sensibilisation ;	RP												
Analyse et traitement des fiches d'entretien ;	RP												
Sélection des candidats ;	RP												
Formation des candidats (composante FPA) ;	FPA												
Signature des conventions de collaboration ;	DP												
Installation et équipement des candidats ;	RP												
Suivi des producteurs installés.	RP												
Installation de 190 bénéficiaires sur les périmètres vivriers aménagés :													
Campagnes d'information et de sensibilisation ;	RP												
Analyse et traitement des fiches d'entretien ;	RP												
Sélection des candidats ;	RP												
Formation des candidats (composante FPA) ;	FPA												
Signature des conventions de collaboration ;	DP												
Installation et équipement des candidats ;	RP												
Suivi des producteurs installés.	RP												
Installation de 10 bénéficiaires sur les élevages aménagés :													
Campagnes d'information et de sensibilisation ;	RP												
Analyse et traitement des fiches d'entretien ;	RP												
Sélection des candidats ;	RP												
Formation des candidats (composante FPA) ;	FPA												
Signature des conventions de collaboration ;	DP												
Installation et équipement des candidats ;	RP												
Suivi des producteurs installés.	RP												
Suivi accompagnement de producteurs sur les anciens périmètres :													
Appui à l'élaboration du projet du candidat ;	RP												
Etudes de dossiers par le comité de validation ;	RP												
Elaboration d'un programme de travail avec le producteur ;	FPA												
Signature des conventions de collaboration ;	DP												
Appuis à l'installation et équipement des candidats ;	RP												
Suivi des producteurs.	RP												
Suivi accompagnement de producteurs hors périmètres :													
Campagnes d'information et de sensibilisation ;	RP												
Analyse et traitement des fiches d'entretien ;	RP												
Visites de terrains ;	RP												
Appui à l'élaboration du projet du candidat ;	RP												
Etudes de dossiers par le comité de validation ;	DP												
Formation des candidats (composante FPA) ;	FPA												
Elaboration d'un programme de travail avec le producteur ;	RP												
Signature des conventions de collaboration ;	DP												
Appuis à l'installation et équipement des candidats ;	RP												
Suivi des producteurs.	RP												
Mise en place du dispositif de conseil en gestion des exploitations													
Intégration des paramètres économiques au suivi des exploitations :													
Collecte des données économiques de l'exploitation (journal de caisse...) ;	RP												
Suivi des indicateurs économiques des exploitations ;	RP												
Analyse continue de ces indicateurs ;	CC												
Restitution aux producteurs et orientation.	RP												
Missions et rapports d'activités													
Missions :													
Appuis aux Représentations	CC												
Appuis aux Représentations pour travaux d'aménagement	AT CC												
Ateliers de formations des agents	RP												
Ateliers de validations des résultats à mi parcours	RP												
Atelier bilan du projet	UGP												
Rapports et comptes rendus :													
Elaboration des canevas des rapports et comptes rendus	CC												
Compte rendus sur l'évolution des installations	RP												
Rapport trimestriel des activités des RP	RP												
Rapport trimestriel des activités de la composante	CC												
Rapport annuel des activités de la composante	CC												

Synthèse des objectifs

En prévision pour l'année 2012, la Composante projette l'aménagement de 245 nouvelles exploitations dont 45 en maraîchage, 190 en vivrier et 10 en élevage, ainsi que le suivi des bénéficiaires installés.

La Composante Appui à la Structuration Professionnelle

Composante Appui à la Structuration Professionnelle	Activités / Opérations / Tâches	RH	Chronogramme 2012																				
			Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc									
Etudes diagnostiques																							
Diagnostiques des nouvelles zones d'intervention/actualisation																							
	Diagnostic agro socio-économique de Moanda et Franceville	CC, RP																					
	Diagnostic agro socio-économique d'Oyem	CC, RP																					
	Diagnostic agro socio-économique d'Okondja	CC, RP																					
	Diagnostic agro socio-économique de Mékambo et Boué	CC, RP																					
	Diagnostic agro socio-économique de Bitam et Mitzié	CC, RP																					
	Diagnostic agro socio-économique de Moabi et Moulengui Bindza	CC, RP																					
	Diagnostic agro socio-économique de Lébamba et Ndendé	CC, RP																					
	Diagnostic agro socio-économique de Lastourville et Pana	CC, RP																					
Etudes des systèmes d'exploitation agricoles																							
	Systèmes d'exploitation agricoles sur l'axe Makokou-Mékambo	CC																					
Système Info Marchés (SIM)																							
Intallation du dispositif dans les provinces																							
	Communication du profil métier de l'ACD aux RP	CC																					
	Appels à candidatures pour le recrutement des ACD	RP																					
	Préparation des modèles de lettres de commandes aux ACD	CC																					
	Audition et sélection des candidats ACD	RP																					
	Signature des lettres de commande	RP, UGP																					
	Formations préalables des ACD	RP																					
	Missions d'identification et de formation des ACD par la composante	CC, ATS																					
	Démarrage des opérations de collecte dans les provinces	RP, TS, ACD																					
	Missions de validation du dispositif dans les provinces	CC, ATS																					
Enquêtes tonnages dans l'Estuaire																							
	Finalisation de la méthode et des outils	CC																					
	Réalisation des premières enquêtes	ATS, ACD																					
	Analyses et validation du dispositif	CC, UGP																					
	Enquêtes continues																						
Note de synthèse des SIM (provinces)																							
	Synthèse des SIM des provinces	RP, TS																					
Rapport de synthèse annuel des résultats nationaux																							
	Rapport annuel des résultats nationaux	ATS, CC																					
Restitution publique des résultats et diffusion du rapport																							
	Restitution des résultats et diffusion du rapport	CC, UGP																					
Suivi Technico-Economique (STE)																							
Dispositif de suivi en élevage																							
	Finalisation des outils de collecte	CC																					
	Finalisation de la base de données	CC																					
	Réalisation des premières collectes et saisies de données	TS																					
	Validation du dispositif	CC, UGP																					
Dispositif de suivi en vivrier																							
	Finalisation des outils de collecte	CC																					
	Finalisation de la base de données	CC																					
	Réalisation des premières collectes et saisies de données	TS																					
	Validation du dispositif	CC, UGP																					
Transfert du nouveau STE aux équipes techniques																							
	Actualisation du "Guide du technicien"	CC																					
	Distribution du Guide à l'ensemble des équipes	CC, UGP																					
	Tenue d'un atelier interne avec l'ensemble des équipes techniques	UGP, CC																					
Fonctionnement normal sur l'ensemble des suivis																							
	Fonctionnement sur l'ensemble des suivis	TS																					
Actualisation de la Base de Données nationale pour tous les suivis																							
	Actualisation de la BD nationale	TS																					
Note de synthèse des STE (provinces)																							
	Synthèse des STE des provinces	RP, TS																					
Appui aux Organisations Collectives (OC)																							
Recrutement d'un agent technique chargé des OC																							
	Proposition d'un profil de poste	CC																					
	Validation du profil de poste par l'UGP	UGP																					
	Appel à candidature et recrutement	UGP																					
Développement d'un dispositif de conseil en gestion des OP																							
	Synthèse de l'expérience du PADAP sur les OP	CC																					
	Synthèse des interventions annexes de l'IGAD sur les OP	CC																					
	Elaboration d'une note technique sur les OP au Gabon (atouts, cont)	CC																					
	Appel de compétences ext pour appuyer la CASP (gestion des OP)	UGP																					
	Elaboration et validation des orientations et outils de facilitation	CE, CC, UGP																					
	Appui des équipes et installation du dispositif dans les provinces	CT, CC																					
Consolidation des OP dans leur gouvernance et gestion																							
	Elaboration d'une fiche d'identification des OP	CC																					
	Identification des OP et dynamiques de groupe existantes	RP, TS																					
	Analyse des fiches et élaboration d'une typologie des OP	CC																					
	Définition de programmes d'appui (offres d'appui des OP par types)	CC, CE																					
	Actualisation des outils de suivi (fiches et BD)	CC																					
Appui à la structuration du secteur agricole et des filières																							
Diffusion de l'information par utilisation des NTIC																							
	Montage d'un cahier des charges pour la création d'un site Web	CL, CC																					
	Lancement d'un appel d'offre pour la création du site Web	UGP																					
	Dépouillement de l'appel d'offre et sélection d'un prestataire	UGP, CL																					
	Montage du site Web par le prestataire	CE																					
	Reception et validation du model monté	CL, CC, UGP																					
	Lancement officiel du site Web	UGP																					
Rapports d'activités																							
	Rapports trimestriels et annuels	CC																					

Synthèse des objectifs

La Composante prévoit pour l'année 2012 de neuf (9) d'études diagnostic des zones d'intervention et une (1) étude des systèmes d'exploitations agricoles.

La Composante Formation Professionnelle

Composante Formation Professionnelle Agricole		Chronogramme 2012												
Activités / Opérations / Tâches		RH	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
Poursuite des sessions de formation des anciens modules														
Formation en maraîchage														
Sessions dans l'Estuaire	ECNO													
Sessions dans le Haut Ogooué	RP													
Sessions dans le Moyen Ogooué	BM													
Sessions dans la Ngounié	ECNO													
Sessions dans la Nyanga	BM													
Sessions dans l'Ogooué Ivindo	ECNO													
Sessions dans l'Ogooué Lolo	CC													
Sessions dans l'Ogooué Maritime	CC													
Sessions dans le Woleu Ntem	RP													
Formation en vivrier														
Sessions dans l'Estuaire														
Sessions dans le Haut Ogooué	RP													
Sessions dans le Moyen Ogooué	ECNO													
Sessions dans la Ngounié	BM													
Sessions dans la Nyanga	ECNO													
Sessions dans l'Ogooué Ivindo	BM													
Sessions dans l'Ogooué Lolo	CC													
Sessions dans l'Ogooué Maritime	BM													
Sessions dans le Woleu Ntem	RP													
Autres modules de formation														
Arboriculture fruitière	BM													
Elevage Poule pondeuse	CN													
Elevage Poulet de chair	CN													
Elevage Porc	CN													
Elevage Petits ruminants	CN													
Gestion des PME/A	CC													
Organisation des Producteurs (OP)	CC													
Formations thématiques sur des thèmes divers														
Adaptation des modules aux données économiques														
Maraîchage														
Collecte des données économiques	BM													
Actualisation des guides du formateur	ECNO													
Actualisation des outils d'animation et d'évaluation	BM													
Actualisation des guides pratiques	CC													
Vivrier														
Collecte des données économiques	BM													
Actualisation des guides du formateur	ECNO													
Actualisation des outils d'animation et d'évaluation	BM													
Actualisation des guides pratiques	CC													
Developpement des sessions sur la commercialisation														
Elaboration du plan de formation														
Analyse de l'existant (contexte, buts, public cible, ...)	CC													
Définition du profil métier	CC													
Définition du profil de formation	CC													
Identification des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels	CC													
Paternariat avec le CMR														
Identification des centres de métiers ruraux existant														
Collecte des données par les RP relatives à l'existence et au fonctionnement des CMR	RP													
Production d'une note de reflexion sur la PFPAR														
Identification de la PFPAR														
Visite des unités de FPAR	CC													
Travaux du réseau FAR														
Identification des activités et des objectifs du réseau	CC													
Rapports d'activités														
Rapports trimestriels et annuels	CC													

Synthèse des objectifs :

Près de 645 stagiaires sont prévus d'être formés au cours de l'année 2012 par la Composante Formation Professionnelle Agricole.

La Composante Recherche d'Accompagnement

Composante Recherche d'Accompagnement		Chronogramme 2012											
Activités / Opérations / Tâches	RH	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc
Poursuite des travaux SCV													
Mise en place d'un dispositif d'essais riz- maïs –soja en SCV													
Suivi de l'essai ;	CTE												
Récolte ;	CTE												
Synthèse des résultats ;	CTE												
Rédaction du compte rendu de l'essai ;	CC												
Capitalisation et diffusion des résultats.	CC												
Poursuite des dispositifs SCV à Nkan et Ntoun													
Suivi des dispositifs en cours	CTE												
Mise en place d'un dispositif rapide de multiplication des bananiers (PIF)													
Dispositif de multiplication de bananiers													
Prospection des sites dans chaque province ;	RP, CTE, CC												
Aménagement des sites retenus ;	Prestataire												
Acquisition des matériels et équipement d'usage pour la construction des geroirs et	CC												
Formation des équipes (équipe RA, RP, techniciens) ;	CARBAP												
Formation des producteurs	RP, CTE, CC												
Montage des geroirs et hangars ;	Prestataire												
Sélection des différentes variétés ;	RP, CTE, CC												
Multiplication ;	CTE, Expl												
Diffusion du matériel végétal	RP, Expl												
Préparation du dispositif expérimental de cultures mécanisées													
Dispositif expérimental de culture mécanisée													
Elaboration du protocole expérimental	CC												
Validation du protocole	UGP												
Evaluation des matériels, équipements et intrants à utiliser	CC												
Préparation des cahiers des charges pour appels d'offres ;	CC												
Lancement des appels d'offres	CC												
Dépouillement des offres et sélection des fournisseurs ;	CC, UGP												
Acquisition de matériels, équipements et intrants.	CC												
Elaboration Termes de références mission Cirad	CC												
Mission Cirad	Consultant												
Préparation et aménagement du site													
Aménagement du site expérimental													
Travaux topographiques ;	Amédé												
Parcelaires	AO, TS												
Etablissement des appels d'offres ;	CC												
Lancement des appels d'offres	CC												
Dépouillement des appels d'offres	CC												
Aménagement des voies d'accès ;	Prestataire												
Nettoyage des sites ;	Prestataire												
Délimitation ;	Equipe CRA												
Construction des bâtiments (bureaux, hangars, magasins, logis gardiens, station de	Prestataire												
Sécurisation des sites (barrière en haies de sisal).	Prestataire												
Mise en place des essais													
Installation et suivi des essais													
Préparation du sol ;	Prestataire												
Mise en place des plantes de couverture ;	AO, TS												
Plantation et semis des cultures ;	AO, TS												
Réalisation des pancartes d'identification des essais ;	AO												
Suivi des essais.	AO, TS												
Planification des priorités de la recherche fondée sur le dialogue entre les équipes et les acteurs/utilisateurs													
Identification des différentes problématiques													
Appropriation des études diagnostic de la composante ASP ;	Equipe CRA												
Analyse des problèmes technico-économiques relayés par la composante ACP ;	CC, Equipe CRA												
Rencontres avec les OPA et les exploitants ;	Equipe CRA												
Collaborations avec d'autres organismes nationaux et internationaux du domaine de la recherche ou de la vulgarisation agricole ;	CC												
Recensement des thématiques pertinentes.	CC												
Validation et hiérarchisation des thèmes et programmes de recherche													
Caractérisation des thématiques pertinentes recensées ;	CC												
Déclinaison des thématiques en objectifs de recherche et impacts pour la production ;	CC												
Tenue d'une commission annuelle de validation des thèmes et programmes de recherche.	CC, UGP												
Introduction de nouvelles cultures et variétés dans le dispositif et chez les producteurs													
Choix des cultures et variétés à introduire													
Définition de critères de choix ;	Equipe CRA												
Caractérisation des cultures et variétés à introduire ;	Equipe CRA												
Définition des thématiques et déclinaison en objectifs de recherche ;	CC												
Présentation en commission de validation des thèmes et programmes de recherche	CC												
Mise en place des essais thématiques en station													
Acquisition de matériel végétal ;	CC												
Aménagement des parcelles et préparation du sol ;	TS												
Plantation et semis ;	TS												
Réalisation des pancartes d'identification des essais ;	TS												
Suivi des essais.	TS												
Synthèse et capitalisation des résultats													
Traitement des données ;	TS												
Analyse et discussion des résultats ;	CC, TS												
Rédaction d'un rapport de synthèse des résultats.	CC												
Partenariat avec les structures de recherche nationales et internationales													
Collaboration avec les autres structures													
Echanges avec les autres structures	CC												
Renforcement de collaboration (Cirad, Carbap, Papafpa, Cenarest, MAEPDR, etc...)	CC, Equipe												
Détermination des termes de collaborations	CC, UGP												
Signature de convention de partenariat	UGP												
Echange des informations	CC												
Participation aux différents ateliers et colloques	CC, Equipe												
Renforcement des capacités des cadres du projet et des bénéficiaires													
Renforcement des capacités des équipes du projet													
Production de synthèses et notes techniques sur les thématiques bouclées ;	CC												
Diffusion à l'ensemble des équipes techniques ;	CC, Equipe												
Organisation d'ateliers internes de présentation des résultats ;	CC, Equipe												
Visites des sites de recherche avec les équipes techniques du projet ;	CTE, AO, TS												
Formations pratiques sur le terrain avec les équipes techniques ;	CC												
Formation sur les techniques de multiplication des bananiers.	CARBAP												
Développement des canaux de diffusion des acquis de la recherche													
Validation des thèmes en milieu réel													
Campagne de sensibilisation des producteurs ;	Equipe CRA												
Visites de terrains des parcelles expérimentales ;	Equipe CRA												
Présentation des différents résultats et innovations ;	Equipe CRA												
Echanges avec les producteurs (entretiens)	Equipe CRA												
Visites de terrains chez les exploitants ;	Equipe CRA												
Sélection des producteurs de référence.	Equipe CRA												
Synthèse et capitalisation des résultats													
Traitement des données ;	CTE, TS												
Analyse et discussion des résultats ;	CC												
Rédaction d'un rapport de synthèse des résultats.	CC												
Rapports d'activités et missions													
Rapports trimestriels et annuels	CC												
Missions de supervisions à l'intérieur du pays	CC, CTE, AO												

Synthèse des objectifs

L'aménagement d'un site expérimental pour la conduite des essais en système mécanisé sur couverture végétale dans la province de l'Estuaire et des dispositifs de multiplication de bananiers dans les bassins de production des 9 provinces sont les principales réalisations physiques prévues pour l'année 2012.

La Composante Transformation Agroalimentaire

Composante Transformation Agro Alimentaire	RH	Chronogramme 2012												
		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	
Elaboration des Procédures, Outils et Méthodologie de travail														
Elaboration de la fiche de procédure	IO													
Elaboration des outils	IO													
Méthodologie de sélection des bénéficiaires	IO													
Méthodologie de suivi des ateliers	IO													
Validation des procédures, outils et méthodologie	IO													
Installation des unités de transformation de produits agricoles														
Installation de 12 ateliers et mise au point des équipements														
Appropriation des études agro socio-économiques réalisées par la CASP et des informations	IO													
Analyses approfondies des acteurs potentiels identifiés par les études	IO													
Prospection des fournisseurs	IO/RP													
Préparation des cahiers des charges des bâtiments et du matériel de transformation	IO													
Elaboration et traitement des dossiers d'appels d'offres	IO/RP/TS													
Sélection des bénéficiaires	IO/RP													
Préparation des dossiers des bénéficiaires	IO/RP													
Validation des appuis des bénéficiaires	UPG													
Animation auprès des bénéficiaires et programmation des opérations	IO/RP/TS													
Construction/Aménagement des locaux	Entreprises													
Installation et mise au point des équipements	IO/RP/TS													
Formation aux techniques de production et de gestion														
Elaboration et adaptation des modules de formation														
Conception des guides du formateur	IO/TS													
Conception des outils d'animation	IO/TS													
Conception des outils d'évaluation	IO/TS													
Conception des guides pratiques														
Réalisation des sessions de formation (sur anciens et nouveaux modules)														
Adaptation des outils	IO/TS													
Préparation des sessions	IO/RP/TS													
Animation des sessions	IO/RP/TS													
Evaluation des sessions	IO/RP/TS													
Suivi technico-économique des bénéficiaires														
Suivi / accompagnement périodique des bénéficiaires	IO/RP/TS													
Evaluation des résultats	IO/RP/TS													
Mise en place et suivi d'un système de contrôle interne de qualité														
Définition des normes de qualité	IO/TS													
Identification des prestataires pour les analyses microbiologiques	IO/TS													
Contractualisation avec les prestataires retenus	IO/TS													
Réalisation du suivi de la qualité	IO/RP/TS													
Proposition d'amélioration de qualité	IO/RP/TS													
Conditionnement et mise en marché de produits transformés														
Visite des unités de transformation et des marchés	IO/RP/TS													
Evaluation des capacités d'absorption du marché	IO/RP/TS													
Dimensionnement de la production en fonction du marché	IO/RP/TS													
Etude de conditionnements adaptés	IO/TS													
Identification de fournisseurs et matériels d'emballage	IO/RP/TS													
Adaptation du module commercialisation à l'activité	IO/TS													
Réalisation de formations à l'endroit des bénéficiaires	IO/RP/TS													
Suivi / accompagnement périodique des bénéficiaires	IO/RP/TS													
Rapports et missions														
Missions d'identification														
Missions de supervision	IO/TS													
Rapports de mission	IO/TS													
Rapports trimestriels	IO/TS													
Rapports annuels	IO/TS													

Synthèse des objectifs

Il est prévu l'aménagement et l'équipement en 2012 de 12 ateliers de transformation de manioc dans les différentes provinces, ainsi que la formation des transformatrices.

7.2. Programmation budgétaire 2012

Le Budget du projet en 2012 est établi en emplois à **2 119 MFcfa**,

Les ressources sont prévisionnellement fixées à **XXXXXX MFcfa**, dont, **XXX MFcfa** sur financement AFD.

Le tableau ci dessous présente les grandes lignes de ce budget dont le détail est donné en annexe du présent document

	Prévisions 2012 (MFcfa)
Emplois	2 442,0
Structure	298,0
Investissement	2,5
Fonctionnement	295,5
PRODIAG	2 119,0
Unité de gestion	600,0
Appui Conseil aux Producteurs (ACP)	540,0
Appui Struct	437,0
Formation P	111,0
Recherch	105,0
Transform	326,0
Autres projets	25,0
Etude Omboué	0,0
Appui aux communautés de Awoun	25,0
Formation CENAF Gabon	0,0
Ressources	3 058,6
PID	270,0
Etat Gabonais sur Fonds Propres	400,0
Etat Gabonais sur emprunt AFD	1 300,0
Union Européenne (AFOP)	0,0
Autres Ressources (Shell Gabon/CENAF)	30,0
Produits financiers	0,4
Report solde antérieur	1 058,2
Solde	616,6

ANNEXES

Annexe 1 :

Annexe 2 :

Budget détaillé 2012

Annexe 3 :

Annexe 4 :

Les ressources humaines dans les représentations

Annexe 1

Annexe 2 : Budget détaillé

BUDGET 2012

Annexe 3

Annexe 4 : Les ressources humaines dans les représentations

