



République Gabonaise
Union – Travail - Justice




PROJET DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT AGRICOLE AU GABON

PRODIAG

Convention de financement N° CGA 1145 01 A

RAPPORT D'ACTIVITE N°8
3^{ème} TRIMESTRE 2013

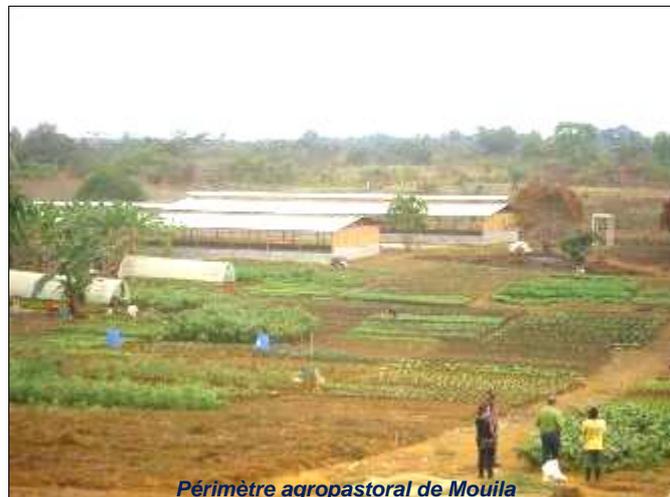

Novembre 2013



Préambule

Le troisième trimestre 2013 a été marqué par le lancement de la première campagne culturelle du PRODIAG dans l'ensemble des provinces du Gabon.

En effet, suite à l'obtention de la première vague de sites agricoles, consécutive aux demandes de terrain formulées auprès des Autorités locales, les procédures de mise en œuvre du projet ont été lancées par les différentes composantes opérationnelles.

Malgré les lenteurs de démarrage à différents niveaux de la chaîne (mobilisation des fonds, réalisation de cahiers des charges, constructions/aménagements, équipements, approvisionnements et fourniture d'intrants et de matériels agricoles,...), les premières exploitations sont en cours de valorisation par les tous premiers bénéficiaires retenus par le projet.

Au 30 septembre 2013, 256 exploitations agricoles dont 195 en production vivrière, 40 en maraîchage, 13 en transformation du manioc, et 7 en multiplication rapide du bananier ont été créées et 499 formations ont été dispensées aux candidats sélectionnés.

La vitesse de croisière de cette opération de mise en valeur des exploitations est attendue à la prochaine campagne culturelle, ciblée pour atteindre les objectifs du projet en termes d'aménagement d'exploitations.

Les réalisations de chaque composante sont présentées dans ce document qui tient lieu de rapport trimestriel d'activité.

TABLE DES MATIERES

1	SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET	4
1.1	Composante Appui Conseil aux Producteurs (CACP)	4
1.1.1	Réalisations physiques par province au cours du trimestre.....	4
1.1.2	Installation des candidats	4
1.1.3	Perspectives du quatrième trimestre.....	5
1.2	Composante Transformation Agroalimentaire (CTAA).....	6
1.2.1	Réalisations physiques du trimestre	6
1.3	Composante Appui à la Structuration Professionnelle	8
1.3.1	Observatoire Economique des Filières (OBSECO)	8
1.3.2	Système d'Information sur les Marchés (SIM)	8
1.3.3	Suivi Technico-Economique (STE)	8
1.3.4	Conseil en Gestion d'Exploitation (CGE).....	9
1.3.5	Communication	9
1.4	Composante Formation Professionnelle Agricole (CFPA)	10
1.4.1	Formation des bénéficiaires du projet	10
1.4.2	Perspectives	11
1.5	Composante Recherche d'Accompagnement	11
1.5.1	Situation des objectifs de la composante au 30 septembre 2013	11
1.5.2	Principales réalisations de la Composante RA.....	11
2	RESSOURCES HUMAINES DU PROJET	13
2.1	Suivi des effectifs du projet	13
3	MISSIONS ET VISITES	14
4	REALISATION BUDGETAIRE	15

1 SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET

1.1 Composante Appui Conseil aux Producteurs (CACP)

Le troisième trimestre est caractérisé par la poursuite des travaux d'aménagement des sites agricoles et par le lancement des installations de bénéficiaires sur les exploitations créées.

1.1.1 Réalisations physiques par province au cours du trimestre

Le traitement des dossiers d'appels d'offres relatifs aux aménagements d'exploitations agricoles se poursuit. Cependant le nombre limité d'entrepreneurs fiables dans les localités de l'intérieur du pays constitue une contrainte préoccupante, qui entraîne certains retard dans l'exécution des travaux ;

Le tableau suivant présente les exploitations créées au 30 septembre 2013.

Tableau n° 1 : Situation des aménagements au 3^{ème} trimestre :

	Objectifs projet					Exploitations aménagées au 30/09/2013				
	Maraîchage	Vivrier	Elevage	PIF	Total	Maraîchage	Vivrier	Elevage	PIF	Total
Estuaire	0	230	20	-	250	0	21	0	1	22
Haut Ogooué	20	110	8	-	138	0	23	0	1	24
Moyen Ogooué	10	40	0	-	50	0	43	0	1	44
Ngounié	30	120	0	-	150	15	16	1	1	33
Nyanga	10	81	0	-	91	0	0	0	1	1
Ogooué Ivindo	20	80	0	-	100	0	0	0	0	0
Ogooué Lolo	15	80	6	-	101	0	0	0	1	1
Ogooué Maritime	5	70	0	-	75	25	40	0	1	66
Woleu Ntem	30	40	5	-	75	0	52	0	0	52
Total	140	851	39	0	1030	40	195	1	7	243
Par rapport aux objectifs du projet						29%	23%	3%	-	24%

Les activités de la Composante au troisième trimestre 2013 ont permis **la création de 243 exploitations** tous domaines confondus, ce qui **représente 24% d'atteinte des objectifs du projet**.

1.1.2 Installation des candidats

La commande du matériel et des intrants agricoles destinés aux candidats sélectionnés se fait au rythme des installations.

1.1.2.1 Les exploitations maraîchères

Tous les kits d'installation (petit matériel et intrants agricoles) sur les exploitations maraîchères sont livrés et les installations sont réalisées à 100% dans la Ngounié et 50% dans l'Ogooué Maritime.

1.1.2.2 Les exploitations vivrières

Les principales spéculations retenues ce cycle pour les exploitations vivrières sont le manioc et le bananier plantain. Pour les tiges de manioc, des contacts sont pris avec des potentiels producteurs locaux après vérification des variétés proposées et de l'état sanitaire du matériel végétal.

L'approvisionnement en petit matériel agricole se fait à partir de Libreville et les livraisons aux différentes représentations sont assurées de façon progressive eu égard aux importantes quantités à transporter.

1.1.2.3 Les exploitations d'élevage

Les appels d'offres relatifs aux commandes des kits pour l'installation des deux éleveurs de la Ngounié sont cours.

1.1.3 Perspectives du quatrième trimestre

Pour le prochain trimestre, la création des exploitations sur les sites en cours d'aménagement va se poursuivre, ainsi que les installations sur les exploitations livrées.

Pour la fin de l'année nous prévoyons un pourcentage d'atteinte des objectifs du projet de près de 39%, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau n° 2 : Prévision de clôture des installations au 31/12/2013

	Objectifs projet					Prévision de cloture 31/12/2013				
	Maraîchage	Vivrier	Elevage	PIF	Total	Maraîchage	Vivrier	Elevage	PIF	Total
Estuaire	0	230	20	-	250	0	25	0	1	26
Haut Ogooué	20	110	8	-	138	0	51	0	1	52
Moyen Ogooué	10	40	0	-	50	0	62	0	1	63
Ngounié	30	120	0	-	150	15	32	2	1	50
Nyanga	10	81	0	-	91	0	25	0	1	26
Ogooué Ivindo	20	80	0	-	100	0	16	0	0	16
Ogooué Lolo	15	80	6	-	101	0	37	0	1	38
Ogooué Maritime	5	70	0	-	75	25	50	2	1	78
Woleu Ntem	30	40	5	-	75	0	56	0	1	57
Total	140	851	39	0	1030	40	354	4	8	406
Par rapport aux objectifs du projet						29%	42%	10%	-	39%

1.2 Composante Transformation Agroalimentaire (CTAA)

1.2.1 Réalisations physiques du trimestre

1.2.1.1 Les aménagements d'ateliers de transformation

Les réalisations de la Composante Transformation Agro Alimentaire (CTAA) au cours du trimestre sont présentées dans le tableau ci-après.

Au cours du 3^{ème} trimestre 2013, 9 ateliers ont été finalisés, 3 sont en cours de construction et 9 dossiers en phase de traitement, dont 2 nouveaux ateliers intégrés dans le cadre d'un partenariat avec OLAM Palm Gabon.



En termes de résultats cumulés par rapport aux objectifs du projet, les réalisations au 30 septembre 2013 sont les suivantes :

Création d'ateliers de transformation de manioc au 30/09/2013			
CTAA	Objectif du projet	Atelier finalisé	% de réalisation par rapport au projet
Estuaire	11	4	36%
Haut Ogooué	4	2	50%
Moyen Ogooué	3	1	33%
Ngounié	5	1	20%
Nyanga	4	1	25%
Ogooué Ivindo	3	0	0%
Ogooué Lolo	3	1	33%
Ogooué Maritime	3	2	67%
Woleu Ntem	4	1	25%
Total	40	13	33%

Sur une prévision de **40 ateliers à créer**, **13 ont été finalisés**. Soit un pourcentage d'atteinte des objectifs de **33 %**.

1.2.1.2 La formation des bénéficiaires

La formation des bénéficiaires a été dispensée en faveur de trois associations dont les ateliers étaient déjà opérationnels. Il s'agit de :



- ☞ l'association DIEU-BENIT, atelier de Ndzong avec 14 bénéficiaires ;
- ☞ l'association ELAT-MEYONG, atelier d'Ongam avec 11 bénéficiaires ;
- ☞ l'association CARITAS, atelier de Lambaréné avec 8 bénéficiaires.

Les délais d'obtention de compteurs électriques auprès de la SEEG sont particulièrement longs dans les provinces et entraînent des retards pour la réalisation des formations des bénéficiaires et la mise en œuvre opérationnelle des ateliers.

1.2.1.3 La gestion de la logistique

Au cours de ce trimestre, un agent a été recruté pour le suivi des questions logistiques et de tous les marchés de travaux et fournitures.

Un dossier pour l'acquisition de 14 nouveaux véhicules du projet a été lancé et traité.

De même, l'installation du système de géolocalisation sur 4 voitures du projet a été réalisée. Cette installation se poursuivra progressivement le trimestre prochain sur le reste des véhicules du projet, dont les 14 nouveaux.

1.2.1.4 Les prévisions du quatrième trimestre

La composante prévoit pour le prochain trimestre les opérations suivantes :

	Objectifs projet	Prévisions de clôture au 31/12/2013	% de réalisation
Estuaire	11	4	36%
Haut Ogooué	4	2	50%
Moyen Ogooué	3	1	33%
Ngounié	5	4	80%
Nyanga	4	2	50%
Ogooué Ivindo	3	0	0%
Ogooué Lolo	3	1	33%
Ogooué Maritime	3	3	100%
Woleu Ntem	4	2	50%
Total	40	19	48%

Sur le plan des aménagements, la prévision au 31 décembre 2013 estime le taux de réalisation à 48% des objectifs du projet.

Les activités à mettre en œuvre d'ici à la fin de l'année vont porter essentiellement sur les points suivants :

- ☞ Le suivi des travaux de construction ;
- ☞ L'équipement des ateliers ;
- ☞ Le suivi des dossiers de demandes de compteurs encore non aboutis;
- ☞ La gestion de la logistique ;
- ☞ La poursuite du suivi technico économique des unités de transformation existantes ;
- ☞ La mise en place du système de contrôle qualité de la pâte de manioc.

1.3 Composante Appui à la Structuration Professionnelle

1.3.1 Observatoire Economique des Filières (OBSECO)

1.3.1.1 Les études diagnostiques

Le diagnostic agro socio-économique de la zone de Mulundu a été bouclé, le rapport de synthèse est disponible au Centre de Documentation Interne (CDI). Une discussion interne sur les conclusions de l'étude sera organisée dès que possible.

1.3.2 Système d'Information sur les Marchés (SIM)

1.3.2.1 Le fonctionnement du dispositif dans l'Estuaire

Le dispositif de l'Estuaire fonctionne normalement et un peu moins de 200 bulletins de prix ont été diffusés au cours du trimestre.

1.3.2.2 L'installation du SIM dans les provinces

Le dispositif SIM a été installé à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Un Agent Collecteur de Données (ACD) a été recruté et formé à la collecte des données.

Sur l'ensemble des provinces, il ne reste que la ville de Makokou, dans la province de l'Ogooué Ivindo qui ne dispose pas encore d'un SIM. Au cours du trimestre, un appel à candidature a été lancé pour le recrutement d'un ACD. L'objectif fixé est d'installer le dispositif à Makokou au cours du prochain trimestre.

1.3.2.3 Le suivi des tonnages

Le suivi des tonnages a été introduit à Tchibanga (province de la Nyanga), ce qui porte à quatre (4) le nombre de SIM provinciaux qui en disposent (après l'Estuaire, l'Ogooué Maritime et le Woleu Ntem).

Il est envisagé au cours du prochain trimestre, de l'introduire dans les provinces du Haut-Ogooué et de la Ngounié.

1.3.2.4 Le rapport SIM 2012

Le traitement des données se poursuit et le rapport est attendu au cours du prochain trimestre.

1.3.3 Suivi Technico-Economique (STE)

1.3.3.1 La production des références

Le dispositif continue d'être fonctionnel dans l'activité maraîchère, au niveau de la province de l'Estuaire, particulièrement en ce qui concerne le suivi des cycles de cultures.

Pour ce qui concerne le suivi des exploitations, il est remplacé dans le nouveau dispositif par l'introduction des outils de conseil en gestion d'exploitation en cours d'élaboration.

Pour le cas des autres ateliers de production (vivrier et élevage de poules pondeuses notamment), les outils ont été montés ou réexaminés. Il ne reste qu'à procéder à leur transfert auprès des équipes, et au démarrage des opérations de collecte.

1.3.3.2 Le conseil technico - économique

Les fiches de visites ont été refaites pour l'ensemble des ateliers de production, de manière à les adapter au PRODIAG. Elles ont déjà été validées pour ce qui concerne le maraîchage et le vivrier (la validation pour les autres ateliers devant se faire très prochainement).

Les opérations de suivis-conseil auprès des producteurs sont prévues de démarrer au cours du prochain trimestre (en octobre et décembre) avec le lancement des installations des bénéficiaires.

1.3.4 Conseil en Gestion d'Exploitation (CGE)

L'examen et le test du modèle de cahier de gestion ont été finalisés pour les différents ateliers (reste quelques aspects à finaliser en élevage), et le modèle validé a déjà été imprimé en quelques exemplaires pour le cahier de gestion en maraîchage et en vivrier.

Les compléments en termes d'outils permettant de définir un « kit » de gestion sont en cours. Le démarrage du CGE auprès des exploitants est prévu au début du prochain trimestre, d'abord sur un échantillon, puis progressivement vers les autres producteurs du projet.

1.3.5 Communication

1.3.5.1 Le montage du site Web du PRODIAG

Un prestataire de bonne audience et bien connu pour le montage des sites web a été contacté, lequel a proposé un devis pour la réalisation du site. Ce devis a été reçu et contact seront pris avec l'AFD pour une demande d'Avis de Non Objection (ANO) sur ce dossier qu'il est nécessaire de faire aboutir.

1.3.5.2 Le Centre de Documentation Interne (CDI)

Le nombre de visiteurs du CDI a quelque peu augmenté au cours du trimestre, passant de 89 pour le compte du trimestre précédent, à 103. Il s'agit comme à l'accoutumé, des étudiants en majorité.

1.4 Composante Formation Professionnelle Agricole (CFPA)

1.4.1 Formation des bénéficiaires du projet



Elle est adressée prioritairement aux agriculteurs à installer sur les exploitations aménagées par le projet. Le rythme de ces formations dépend de l'évolution des aménagements d'exploitations réalisées par la Composante ACP.

Le tableau ci-dessous présente les réalisations de l'équipe formation au 30 septembre 2013.

Indicateurs	Unité	Au 30 /09/ 2013			%
		Prévision	Réal.	Ecart	
Nb de sessions en Cultures vivrières	Session	24	11	-13	46%
Nb de sessions en Gestion	Session	2	0	-2	0%
Nb de sessions en Formation des OP	Session	0	0	0	
Nb de sessions en Transformation de Manioc	Session	24	6	-18	25%
Nb de sessions en Maraîchage	Session	8	18	10	225%
Nb de formations dispensées en Cultures vivrières	Formation	359	140	-219	39%
Nb de formations dispensées en Gestion	Formation	30	0	-30	0%
Nb de formations dispensées en Transformation de Manioc	Formation	288	72	-216	25%
Nb de formations dispensées en Elevage	Formation	120	59	-61	49%
Nb de formations dispensées en Phytosanitaire	Formation	0	0	0	
Nb de formations dispensées en Maraîchage	Formation	120	228	108	190%
Nb de formations dispensées en Arboriculture	Formation	0	0	0	
Nb de formations dispensées en OP	Formation	0	0	0	
Nb de sessions organisées par rapport à 2013	Session	58	35	-23	60%
Nb de sessions organisées par rapport au Projet	Session	177	35	-142	20%
Nb de formations dispensées par rapport à 2013	Formation	917	499	-418	54%
Nb de formations dispensées par rapport au Projet	Formation	3643	499	-3144	14%

Au 30/09/2013, **499 formations réparties en 35 sessions** ont été dispensées par le projet en faveur des bénéficiaires. **Soit 14% des objectifs du projet atteints.**

Les graphes ci-dessous en donnent la répartition des stagiaires par atelier et par sexe détails :

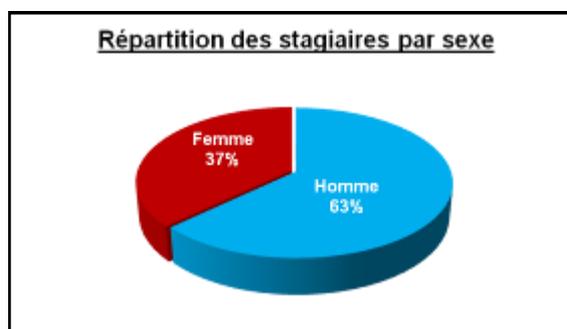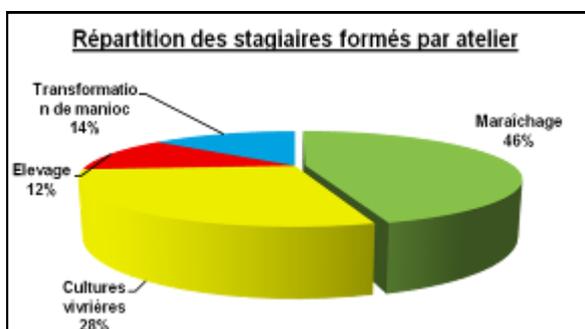

Le maraîchage occupe près de la moitié des personnes formées (46%), suivi des cultures vivrières (28%), de la transformation du manioc (14%) et enfin de l'élevage (12%).

Par rapport à la répartition selon le sexe, les femmes représentent 37% des formés, tandis que les hommes occupent 63%.

1.4.2 Perspectives

Au cours du 4^{ème} trimestre 2013, le rythme de formation va être très soutenu et correspondra à la mise en place des cultures sur les exploitations vivrières du projet.

1.5 Composante Recherche d'Accompagnement

1.5.1 Situation des objectifs de la composante au 30 septembre 2013

Le tableau ci-dessous présente la réalisation des objectifs de la composante par rapport à l'année 2013.

Indicateurs	Unité	au 30 / 09 / 2013			Fin sept % d'écart réalisation/prévision
		Prévision	Réal.	Ecart	
Mise au point des systèmes - CRA					
Nb d'essais réalisés	Essai	4	4	0	100%
Modèles d'exploitations mis au point	Exploitation	2	1	-1	50%
Nb de fiches itinéraires techniques	Fiche technique	0	0	0	-
Nb d'exploitants adoptant les nouvelles cultures et variétés	Exploitant	477	15	-462	3%
Nb de parcelles de comparaison	Parcelle	0	0	0	-
Nb d'ateliers d'échange et de restitution organisés	Atelier	1	1	0	100%
Participation aux colloques internationaux et partenariats	Réunion	0	0	0	-
Nb de publications sur les revues scientifiques ou spécialisées	Publication	1	0	-1	0%

Le faible niveau des exploitants adoptant les nouvelles cultures et techniques pourrait être amélioré au cours du prochain trimestre à cause du démarrage de la campagne agricole.

La publication d'un article scientifique est prévue d'ici la fin de l'année 2013.

1.5.2 Principales réalisations de la Composante RA

1.5.2.1 L'installation des unités de multiplication rapide de bananier (Technique du PIF)

Après la session de formation organisée à Ntoun le trimestre dernier, sept (7) unités de multiplication rapide des bananiers ont été construites dans sept des neuf provinces du pays.

Dans le Woleu Ntem l'unité est en cours de construction tandis que dans l'Ogooué Ivindo le candidat est en cours de sélection.

1.5.2.2 Le site de Matoto

Les activités sur le site de Matoto ont porté essentiellement sur l'aménagement de 7 hectares de terrain qui seront mis en valeur au trimestre prochain.

Les cultures de bananier, maïs, manioc et soja seront mises en place sur les couvertures végétales de Bracharia, Mucuna et Pueraria.



2 RESSOURCES HUMAINES DU PROJET

2.1 Suivi des effectifs du projet

Nom et prénom	Fonction	Statut	Présent au 01/07/13	Entrée	Sortie	Présent au 30/09/13
Sébastien KOUMBA	Coordonnateur Technique	Cadre gabonais	1			1
Germain MBOUROU	Chef Composante ACP	Cadre gabonais	1			1
Irmine OGANDAGAS	Chef Composante TAA	Cadre gabonais	1			1
Jean Jacques EDZANG	Chef Composante RA	Cadre gabonais	1			1
Germain EDOU EDOU	Chef Composante ASP	Cadre gabonais	1			1
Michel ASSOUME	Chef Composante FPA	AM gabonais	1			1
Stéphane LELO	Détaché Total Gabon	Cadre gabonais	1			1
Stan Patrick MBINA	RP Moyen Ogooué	AM gabonais	1			1
Alain CHARBONNIER	RP Ngounié	AM gabonais	1			1
J. G. BALONDI	RP Nyanga	AM gabonais	1			1
Nirrys SANDZA PEPPE	RP Ogooué Lolo	Cadre gabonais	1			1
Arsène NDONG ABESSOLO	RP Ogooué Maritime	Cadre gabonais	1			1
Jude MINTO OLLOMO	RP Woleu Ntem	AM gabonais	1			1
Jean Martin EBANG	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
J.R. EDOU NDONG	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
P. MVOMO ASSOUMOU	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
Charles NZEGO	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
Brice MVE	Formateur	AM gabonais	1			1
Liliane OGANDAGA	Formatrice	AM gabonais	1			1
Edith NTAWANGA	Formatrice	AM gabonais	1			1
Christian T. EKWAGHE	Technicien Supérieur RA	AM gabonais	1			1
Ornella DIGOMBOU N.	Technicien Supérieur ASP	AM gabonais	1			1
Albert MSSEKE	Enquêteur ASP	AM gabonais	1			1
Danièle G. EFFA NDONG	Ingénieur TAA	AM gabonais	1			1
Charlène MIYAKOU T.	Ingénieur FPA	AM gabonais	1			1
Ralph NDONG NZANG	Ingénieur ACP	AM gabonais	1			1
Chriss Mac MBOUNGUI	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
Davy Franck NGOUSSI	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1		1	0
Thom's EDOU ABESSOLO	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
Christian ASSEMBE NGUEMA	Ingénieur ACP	AM gabonais	1			1
Tanguy NKOUAH YALI	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1		1	0
Arnaud KOMBILA MUSSAVU	Ingénieur ACP	AM gabonais	1			1
Yvon MOUSSAVOU M.	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
Régis ELLA NKOCHO	RP Ogooué Ivindo	AM gabonais	1			1
James Edouard YEMBI	Enquêteur ASP	Employé Gabonais	1			1
Prisca KELIET	Secrétaire Comptable	AM Gabonais	1			1
Ghislaine BARRO	Secrétaire	Employé Gabonais	1			1
Reine Léa EYENG N.	Secrétaire	Employé Gabonais	1			1
Pierre NGOUA WIRI	Aide laborantin/Bibliothèque	Employé gabonais	1			1
KOUDOU GOU ZIDA	Gardien	Employé N gabonais	1			1
OWANLELE Pierre	Chauffeur coursier	Employé gabonais	1			1
Crépin R. ONGOTHA	Gardien	Employé gabonais	1			1
Herman W. BISSIÉLO MOUELE	Gardien	Employé gabonais	1			1
Germain GNANDE MBOUMBA	Ouvrier d'entretien	Employé gabonais	1			1
Sosthène D. NZENG NGUEMA	Ingénieur CRA	AM gabonais	1			1
Emmanuel OBIANG ONDO	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
Christian MIHIMBALOBA	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
Nadège IGNANGA	Technicien Supérieur RA	AM gabonais	1			1
Stella M. MBOUGHA	Ingénieur ASP	AM gabonais	1			1
Téléfort NSO BIYOGHE	Ingénieur CRA	AM gabonais	1			1
Yvon M. MVEH ETOUGHE	Ingénieur CRA	AM gabonais	1			1
Lessandro B. TSANGA	Technicien Supérieur TAA	AM gabonais	1			1
Félix G. NGOMBYH O. N.	Technicien Supérieur ACP	AM gabonais	1			1
Marie Christine BAKITA	Technicien Supérieur RA	AM gabonais	1		1	0
Christian N. ATANGANA MOUELE	Aide Comptable	AM gabonais		1		1
Gabriel BEKA B'EDOU	Ingénieur logisticien	AM gabonais		1		1
TOTAL			54	2	3	53

Au cours du trimestre 3 agents ont quitté le projet et 2 ont été recrutés, ce qui porte l'effectif de 54 à 53 agents.

3 MISSIONS ET VISITES

➤ Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural a visité, entre autres, les opérations menées par l'IGAD dans 7 des 9 provinces du pays, à l'occasion de la première phase d'une tournée provinciale organisée du 22 juillet au 8 août 2013.



➤ Une mission de supervision du projet a été conduite par Madame Marie-Cécile THIRION Chef de projet de l'Agence Française de Développement, Département Développement Durable, Division Agriculture Ruralité et Biodiversité, du 30 septembre au 6 octobre 2013

Une présentation des activités du PRODIAG a été faite par les équipes du projet au terme de la rencontre avec les Autorités administratives.

La mission s'est poursuivie par des visites de terrain dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen Ogooué et de la Ngounié.



4 REALISATION BUDGETAIRE

Libellé	Code analytique	Coût unitaire	Unité	Qté	Budget initial	Réalisations au 30/09/13	Ecart	%
C1 Appui conseil aux producteurs	C1				2 488 044 899	1 138 808 125	-1 349 236 774	46%
C2 Formation professionnelle agricole	C2				756 318 423	220 360 758	-535 957 665	29%
C3 Recherche d'accompagnement	C3				642 637 863	256 565 393	-386 072 469	40%
C4 Structuration professionnelle	C4				706 163 773	293 820 945	-412 342 827	38%
C5 Appui à la transformation agro-alimentaire	C5				398 821 858	125 188 454	-273 633 403	31%
C6 Fonds d'appui à l'installation et à l'équipement des exploitants agricoles	C6				4 360 306 868	657 138 910	-3 703 167 958	15%
C7 Recensement des exploitations et Cellule de réflexion	C7				829 785 605	7 839 144	-821 946 461	1%
C8 Unité de gestion	C8				1 727 134 780	477 555 904	-1 249 578 786	28%
C9 Comité de pilotage	C9				355 528 695	5 825 000	-349 703 695	2%
C10 Supervision comptable et audits annuels	C10	2%			237 498 435	101 098 540	-136 397 895	43%
Imprévis		5%			627 750 851	0	-627 750 851	0%
TOTAL					13 119 140 048	3 244 305 264	-9 874 834 784	25%

La réalisation budgétaire cumulée au 30 septembre 2013 s'établit à :

- 3,244 Milliards de Francs CFA
- Soit 25% du budget total du projet.

